



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

Relatório Mensal de Acompanhamento de Obra

Obra: Inspeção Regional do CREA/SC – MUNICÍPIO	Observações: <ul style="list-style-type: none">• O relatório mensal de fiscalização da obra deve ser emitido para atualizar o Departamento de Engenharia - DENG sobre o andamento da obra.• O prazo para entrega do relatório mensal é até o quinto dia útil após o mês de avaliação.• As fotos inseridas no relatório deverão ser datadas e georreferenciadas.• Entregar em conjunto com CHECK LIST.
Contrato n.º.: 000/20XX	
Período Correspondente: XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX	
Medição n.º.:00	
Revisão 00	
Informações Adicionais: XXXXXXXXXXXXX	

1. Dados gerais do contrato de execução da obra

Inserir aqui dados do contrato, datas de assinatura, emissão de ordem de serviço, aditivos realizados, etc.

Apresentar em formato de quadro.

Análise e parecer prévio sobre o Boletim de Medição elaborado pela empresa executora.

2. Serviços realizados pela empresa executora durante período de acompanhamento

Relatar aqui o período a qual se refere o relatório, condições do tempo nesse período e seu impacto na obra.

Relatar os serviços realizados pela empresa executora da obra durante o período de acompanhamento correspondente - todas as frentes de trabalho abertas no período, indicando se foram concluídas ou não.

Demonstrar com tabelas, quadros, gráficos: os percentuais de serviço executado (no período e acumulado); os valores pagos (no período e acumulado) e saldo de contrato; o avanço frente ao cronograma físico-financeiro previsto e histograma físico-financeiro.

3. Serviços realizados pela Fiscalização durante período de acompanhamento

Relatar aqui os serviços realizados pela empresa de fiscalização da obra durante o período de acompanhamento correspondente.

Demonstrar em tópicos ou quadros, os dias de visita, horários de permanência, atividades administrativas relacionadas ao acompanhamento (datas e horas dedicadas no âmbito interno).

Avaliação técnica dos serviços realizados pela empresa executora.

Documento assinado eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

4. Registros do canteiro de obras, mão-de-obra, materiais e equipamentos

Relatar aqui a situação do canteiro de obras, por exemplo, se está organizado e limpo, ou relatar os problemas verificados. Demonstrar por meio de tabelas, quadros, gráficos, a situação da mão-de-obra (no período e média acumulada - Histograma de mão de obra), se o fluxo de materiais e equipamentos está adequado para o período e para atendimento do cronograma físico-financeiro previsto e demais informações adicionais.

5. Registros da qualidade técnica, ambiental e segurança do trabalho

Indicadores de desempenho e de qualidade da obra.

Relatar aqui a qualidade técnica dos serviços realizados no período, se as normas e boas práticas foram respeitadas, apresentar os resultados e análise dos ensaios e testes realizados no período - controles tecnológicos dos materiais. Descrição das alterações de projeto efetuadas, com os motivos que ensejaram e identificação de quem aprovou as modificações.

Relatar se a empresa está cumprindo o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, fazendo os descartes e reaproveitamentos adequados, etc. Relatar aqui o uso de EPI's por parte da mão-de-obra, se as normas de segurança do trabalho estão sendo cumpridas em sua totalidade, informações sobre acidente de trabalho no período e demais informações adicionais ocorridas.

6. Relatório Fotográfico

Imagens da evolução do serviço mensal.

Expor os registros fotográficos feitos ao longo do período de acompanhamento

Os registros devem estar datados, georeferenciados, coloridos, se possível todos nas mesmas dimensões/proporções, dispostos em ordem cronológica.

7. Considerações

Relatar aqui quaisquer intercorrências observadas no período, que não relatadas em tópicos anteriores, e/ou quaisquer observações ou considerações julgadas pertinentes de registro documental.

Documento assinado eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

Exemplos ITEM 6 (Relatório Fotográfico):

Figura 1 – Legenda




Figura 2 – Legenda



Exemplos ITEM 2 (Serviços realizados pela empresa executora durante período):

Gráfico AVANÇO FÍSICO

MÊS	% Execução Planejado	% Execução Realizado
Mês 1	3,99%	0,00%
Mês 2	10,05%	0,00%
Mês 3	18,85%	0,00%
Mês 4	29,87%	0,00%
Mês 5	39,71%	0,00%
Mês 6	55,89%	0,00%
Mês 7	64,14%	0,00%
Mês 8	78,61%	0,00%
Mês 9	92,97%	0,00%
Mês 10	100,00%	0,00%

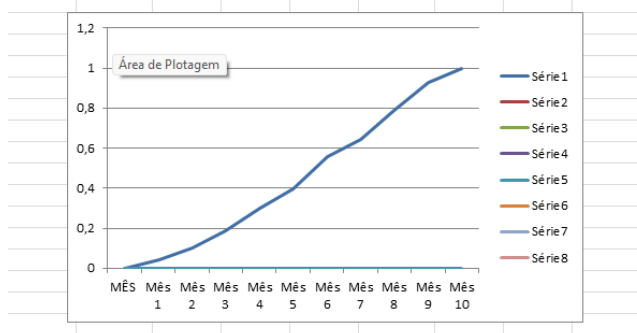

Documento assinado eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

Gráfico FLUXO DE CAIXA

MÊS	Valores a pagar	Valores pago	Saldo do Contrato (Acumulado)
Mês 1	R\$ 79.857,41	R\$ 79.857,41	R\$ 1.922.263,74
Mês 2	R\$ 121.324,66	R\$ 121.324,66	R\$ 1.800.939,08
Mês 3	R\$ 176.280,97	R\$ 176.280,97	R\$ 1.624.658,11
Mês 4	R\$ 220.551,92	R\$ 220.551,92	R\$ 1.404.106,19
Mês 5	R\$ 196.959,43	R\$ 196.959,43	R\$ 1.207.146,76
Mês 6	R\$ 324.018,26	R\$ 324.018,26	R\$ 883.128,50
Mês 7	R\$ 165.109,67	R\$ 165.109,67	R\$ 718.018,83
Mês 8	R\$ 289.825,01	R\$ 289.825,01	R\$ 428.193,82
Mês 9	R\$ 287.530,55	R\$ 287.530,55	R\$ 140.663,27
Mês 10	R\$ 140.663,27	R\$ 140.663,27	R\$ 0,00
	R\$ 2.002.121,15	R\$ 2.002.121,15	

Gráfico HISTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS	% Execução Física Acumulada	Valor Financeiro Realizado Acumulado (R\$)
Mês 1	3,99%	R\$ 79.857,41
Mês 2	6,06%	R\$ 121.324,66
Mês 3	8,80%	R\$ 176.280,97
Mês 4	11,02%	R\$ 220.551,92
Mês 5	9,84%	R\$ 196.959,43
Mês 6	16,18%	R\$ 324.018,26
Mês 7	8,25%	R\$ 165.109,67
Mês 8	14,48%	R\$ 289.825,01
Mês 9	14,36%	R\$ 287.530,55
Mês 10	7,02%	R\$ 140.663,27
	100,00%	R\$ 2.002.121,15

Documento assinado eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
